

FICHA TÉCNICA DE CIERRE DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: Proyecto de equipo de recolección para residuos sólidos

Ubicación: Tijuana, Baja California

Sector: Residuos sólidos

Certificación: Jun-06


Obra terminada: Jun-09

Informe de cierre: May-14



Condiciones previas al proyecto

El crecimiento demográfico experimentado por la ciudad de Tijuana en la última década creó una excesiva producción de desechos y una demanda extraordinaria de servicios públicos, en particular en lo referente a la recolección, transferencia y disposición de residuos sólidos municipales. Este rezago en la recolección, causado por la falta de infraestructura, ocasionó que una cantidad considerable de residuos sólidos fueran desechados en tiraderos clandestinos, lotes baldíos, barrancas y cauces de arroyos sin ningún control. Lo anterior provocó situaciones insalubres y de alto riesgo para el medio ambiente y la salud pública.

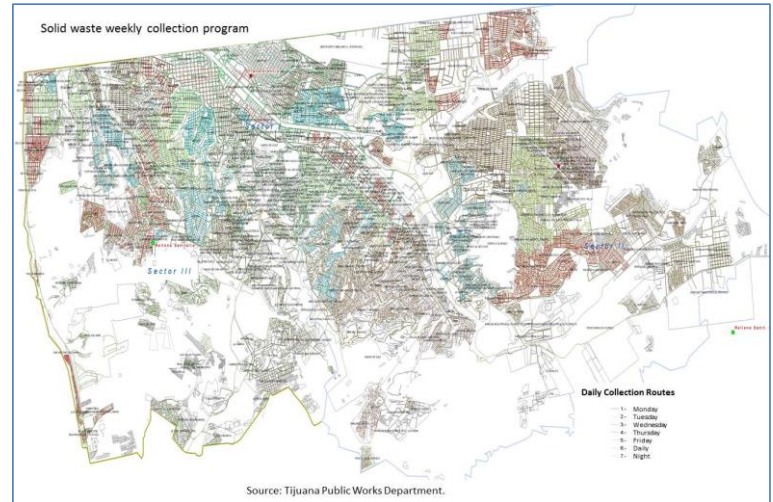

Objetivo del proyecto

El objetivo del proyecto fue mejorar la gestión de los residuos sólidos mediante la adquisición de nuevos equipos. El proyecto contribuye a reducir el riesgo de enfermedades causadas por la contaminación relacionada con la tira clandestina de basura de tipo doméstico en las calles y en lugares como los cauces de los arroyos y lotes baldíos en Tijuana, Baja California.

Alcance del proyecto

El alcance del Proyecto fue mejorar la gestión de los residuos sólidos mediante la adquisición de nuevos equipos que serviría para ampliar el servicio de recolección a zonas desatendidas y optimizar las operaciones en las estaciones de transferencia.

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Inversión real: \$(MDD) | 4.67M |
| Subsidio del BDAN: SWEP | 0.5M |
| Crédito del BDAN: | 1.72M |
| Otras fuentes: | 2.45M |

| Inversión prevista \$(MDD) | Al certificar | Variación |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|
| Subsidio del BDAN: SWEP | 0.5M | 0.0M |
| Crédito del BDAN: | 2.27M | (0.55M) |
| Otras fuentes: | 2.27M | 0.18M |
| Total: | 5.04M | (0.37M) |

Otras fuentes: Fondos Municipales

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Población beneficiada: | 1,490,128 |
|-------------------------------|------------------|

Resultados

| Efectos | Indicadores | Meta | Real 2014 |
|---|-----------------------|-------------|------------------|
| Aumento del acceso a los servicios de recolección de residuos sólidos | Cobertura de servicio | 82.40% | 93% |

| Productos | |
|--|----|
| Vehículos recolectores | 25 |
| Vehículos operativos (utilizados en las estaciones de transferencia) | 38 |

Aportaciones importantes del proyecto

La recolección de basura en la ciudad aumentó de **82.4%** en la fecha de certificación a **93%** después de la ejecución del proyecto. Lo anterior representa casi 400,000 hogares más que ahora reciben este importante servicio.

